

都市再生整備計画 事後評価シート  
佐波川新橋地区

平成31年3月


やまぐちけん ほうふし  
山口県 防府市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	山口県		市町村名	防府市		地区名	佐波川新橋地区			面積	174ha		
交付期間	平成27年度～平成30年度		事後評価実施時期	平成30年度		交付対象事業費	398百万円		国費率	0.4			
1)事業の実施状況	事業名												
	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	公園((仮称)桜づつみ円筒分水公園)、地域生活基盤施設(広場、駐車場、情報板、広場(ポケットパーク))、高質空間形成施設(緑化施設等、公衆トイレ)										
		提案事業	地域創造支援事業(多目的広場整備、まちづくり支援事業(イベント等))、事業活用調査(事業効果分析調査)、まちづくり活動推進事業(まちづくり支援事業(周辺マップ作成))										
	事業名												
	当初計画から新たに追加した事業	基幹事業	なし	-									
提案事業	なし	-											
交付期間の変更	当初	平成27年度～平成29年度	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		-								
	変更	平成27年度～平成30年度	-										
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値		数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
				基準年度		目標年度	モニタリング	評価値					
	指標1	河川利用者数	人/年	8,500	H25	9,900	H29		5,943	△	あり ●	・イベント利用の除いた申請利用者は約425人増加しており、一定の事業効果があったと判断できる。	H31年12月
	指標2	河川の満足度	%	34	H25	39	H30		58	○	あり なし	・かわまちづくり計画が実現されたことにより、佐波川利用者の満足度が向上したと判断できる。	-
指標3	遊歩道と周辺道路の自転車歩行者数	人/日	408	H25	450	H30		334	△	あり なし	・県道三田尻港徳地線の修景整備がH31年3月完成のため、佐波川と中心地を結ぶ回遊動線の創出効果が限定的となったことが要因と考えられる。	H31年9月	
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値		数値		目標達成度※1	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
				基準年度		目標年度	モニタリング	評価値					
	その他の数値指標1	河川の利用の有無	%	62	H25				66		・かわまちづくり計画が実現されたことで、佐波川の魅力が向上し、利用したことのある人の割合が増加した。	-	
	その他の数値指標2	イベント以外の申請利用者数	人/年	743	H25				1,168		・かわまちづくり計画が実現されたことで、佐波川の魅力が向上し、日常的な利用者数が増加した。	-	
その他の数値指標3	防府サイクリングターミナルの貸自転車数(宿泊利用者数)	人/年	158 (2,508)	H25				176 (3,313)		・自転車道周辺にトイレや周遊コースを示した情報板等施設を整備したことで、サイクリングの機運も高まり回遊性が向上したことで貸自転車数が増加した。	-		
4)定性的な効果発現状況	かわまちづくり計画の実現に対し、アンケートにおいて好評の意見が多く挙げられた。												
5)実施過程の評価			実施内容				実施状況				今後の対応方針等		
	モニタリング	河川利用者数(利用申請数)	都市再生整備計画に記載し、実施できた				-				今後も継続的に実施し、事業効果の確認を行う。		
			都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				●						
			都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				-						
住民参加プロセス	かわまちづくり協議会 佐波川周辺マップ作成ワークショップ 遊々かわフェスタ	都市再生整備計画に記載し、実施できた				-				今後も引き続きかわまちづくりを推進するために、かわまちづくり協議会及びイベントを開催していく。			
		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				●							
		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				-							
持続的なまちづくり体制の構築	かわまちづくり協議会	都市再生整備計画に記載し、実施できた				-				今後も引き続きかわまちづくりを推進するために、かわまちづくり協議会を開催していく。			
		都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				●							
		都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				-							

様式2-2 地区の概要

佐波川新橋地区(山口県防府市) 都市再生整備計画事業の成果概要								
まちづくりの目標	目標を定量化する指標		従前値		目標値		評価値	
佐波川の魅力を最大限に発揮できる環境整備、歴史性に配慮した公共空間や地区内の回遊動線の整備を行うことで、佐波川を活かしたまちづくりを実践を図る。  大目標:「佐波川を活かしたまちづくりの実践」 目標1:安心して利用できる水辺空間の創出 目標2:自然と歴史を活かした魅力ある環境の整備 目標3:快適で安全安心な歩行空間の創出	河川利用者数	単位:人/年	8,500	H25	9,900	H29	5,943	H29
	河川の満足度	単位:%	34	H25	39	H30	58	H30
	遊歩道と周辺道路の自転車歩行者数	単位:人/日	408	H26	450	H30	334	H30
	河川の利用の有無	単位:%	62	H25	-	-	66	H30
	イベント以外の申請利用者数	単位:人/年	743	H25	-	-	1,168	H30
	防府サイクリングターミナルの貸自転車数(宿泊利用者数)	単位:人/年	158 (2,508)	H25	-	-	176 (3,313)	H29

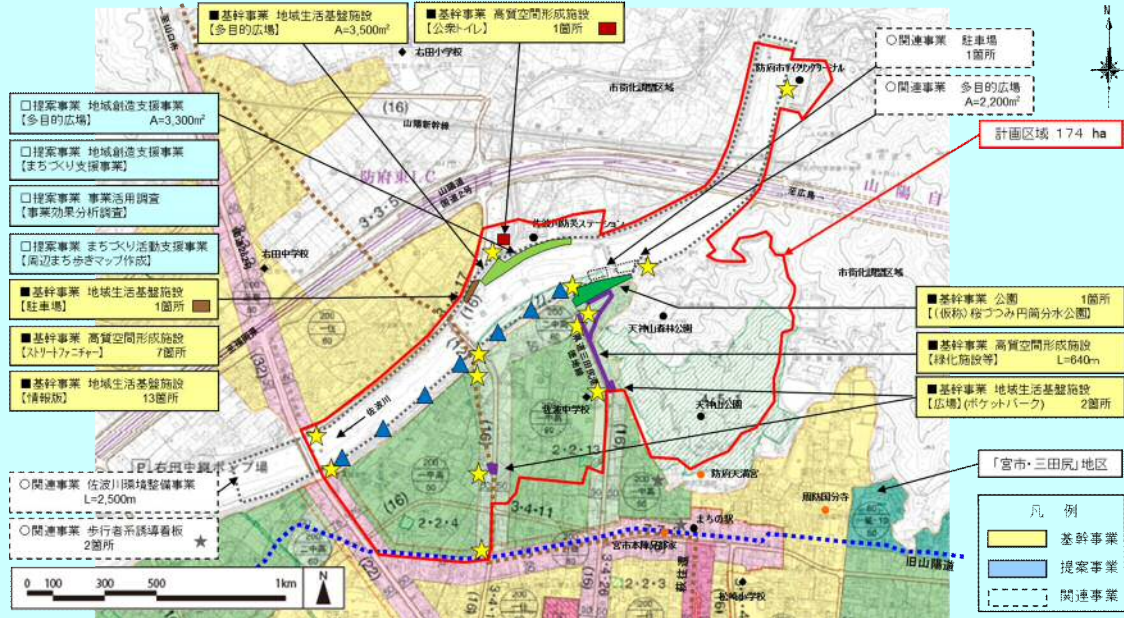

まちの課題の変化	<ul style="list-style-type: none"> <li>河川の利用者や満足度は増加・向上傾向にあり、安心して利用できる水辺空間の創出、魅力ある環境の整備が実現している。</li> <li>他地区でも安心して利用できる親水空間を増やし、河川と周辺環境の価値を更に向上させ、かわまちづくりの取組みを発展させる必要がある。</li> <li>宮市・三田尻地区などの市の中心地との回遊性については、道路修景整備を引き続き実施する必要がある。</li> <li>更に、今後立地適正化計画などによるコンパクトシティの形成が実践されるにあたり、佐波川新橋地区の中心拠点内の位置づけを整理し、居住誘導等に資するまちづくりを進める必要がある。</li> </ul>
今後のまちづくりの方策(改善策を含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>宮市・三田尻地区などの市の中心地とのつながりを向上させるためにソフト・ハード両面からかわまちの結節点を強化し、歴史とかわを活かしたまちづくりを推進する。</li> <li>かわまちづくりを玉祖地区、華城地区、古祖原地区に派生させ(かわまちづくり計画の区域を拡大)、さらなる水辺の親水性の向上と回遊性の向上を図る。さらに、それによる地域の活性化を図る。</li> <li>イベント等の開催や情報発信により、整備箇所の認知度を向上させることにより、河川利用者数の向上を図る。</li> </ul>
